

Simec – Obras 2.0 MI


CGIMP – Março/2014

Orientações Inserção de Evolução – Empresa MI

Cadastro de evolução – Empresa MI

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Emissão OS de Sondagem

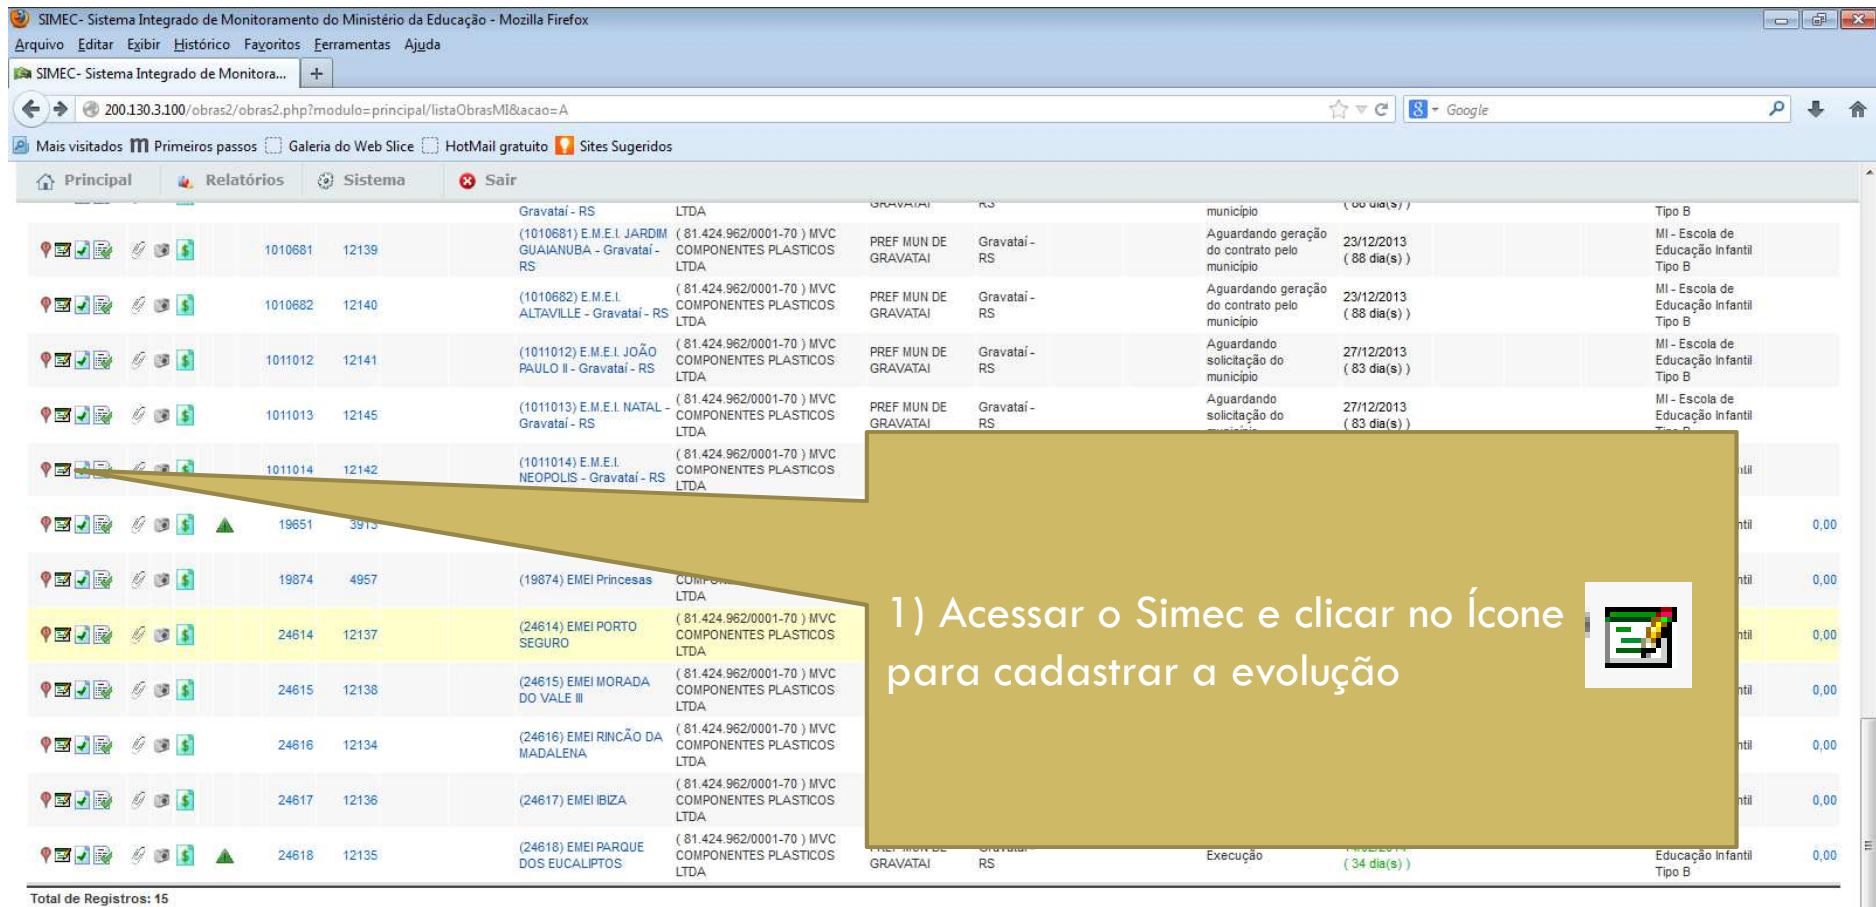

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

SIMEC - Sistema Integrado de Monitora... +

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&acao=A

Mais visitados Primeiros passos Galeria do Web Slice HotMail gratuito Sites Sugeridos

Principal Relatórios Sistema Sair

			Gravataí - RS	LTDA	GRAVATAÍ	RS	município	(00 dia(s))		Tipo B	
	1010681	12139	(1010681) E.M.E.I. JARDIM GUAIANUBA - Gravataí - RS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	Gravataí - RS	Aguardando geração do contrato pelo município	23/12/2013 (88 dia(s))		MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	
	1010682	12140	(1010682) E.M.E.I. ALTAVILLE - Gravataí - RS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	Gravataí - RS	Aguardando geração do contrato pelo município	23/12/2013 (88 dia(s))		MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	
	1011012	12141	(1011012) E.M.E.I. JOÃO PAULO II - Gravataí - RS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	Gravataí - RS	Aguardando solicitação do município	27/12/2013 (83 dia(s))		MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	
	1011013	12145	(1011013) E.M.E.I. NATAL - Gravataí - RS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	Gravataí - RS	Aguardando solicitação do município	27/12/2013 (83 dia(s))		MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	
	1011014	12142	(1011014) E.M.E.I. NEOPOLIS - Gravataí - RS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA							
	19651	3915									0,00
	19874	4957	(19874) EMEI Princesas	COMPONENTES PLASTICOS LTDA							0,00
	24614	12137	(24614) EMEI PORTO SEGURO	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA							0,00
	24615	12138	(24615) EMEI MORADA DO VALE III	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA							0,00
	24616	12134	(24616) EMEI RINCÃO DA MADALENA	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA							0,00
	24617	12136	(24617) EMEI IBIZA	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA							0,00
	24618	12135	(24618) EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	RS	Execução	(34 dia(s))		Educação Infantil Tipo B	0,00

Total de Registros: 15

1) Acessar o Simec e clicar no Ícone para cadastrar a evolução

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

SIMEC - Sistema Integrado de Monitora...

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaEvolucaoMi&tacao=A

Mais visitados M Primeiros passos Galeria do Web Slice HotMail gratuito Sites Sugeridos

SIMEC Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados do Empreendimento Lista de obras do empreendimento Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Restrições e Inconformidades

Registro de Atividades Execução Orçamentária Validação Extrato da Obra

Situação atual: Execução | Última atualização: | Supervisão FNDE | Extrato da Obra | Pendências | Acessar Obras 1 | Editar Licitação | Editar Contrato | Inserir aditivo | Histórico do contrato | Evolução MI

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (19651) EMEI Morada do Vale II
Pré-obra: (3913) EMEI Morada do Vale II
Município - UF: Gravataí - RS
Obra: (19651) EMEI Morada do Vale II

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Lista de Evolução MI

Ação	Data da Evolução	Data de Inclusão	Responsável	% Medido (Edificação)	% Validado (Edificação)	Valor (R\$) (Edificação)	% Medido (Serviços Externos)	% Validado (Serviços Externos)
Nenhuma evolução cadastrada.								

Cadastrar Nova Evolução

2) Clicar em cadastrar Nova Evolução

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadEvolucaoMi&tacao=A

Mais visitados | Primeiros passos | Galeria do Web Slice | HotMail gratuito | Sites Sugeridos

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (19651) EMEI Morada do Vale II
Pré-obra: (3913) EMEI Morada do Vale II
Município - UF: Gravataí - RS
Obra: (19651) EMEI Morada do Vale II
Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Cadastro de Evolução MI

Dados do Acompanhamento

Data do Acompanhamento:
Data Prevista de Conclusão:
Nome do Responsável: FERNANDA RIBEIRO DE A...

Edificação

% da Evolução:
Valor da Evolução (R\$):


Detalhamento d

Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término
-----------	-------------	----------------	------------	-------------------	----------------	-----------------

3) Preencher os campos com a as informações solicitadas

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

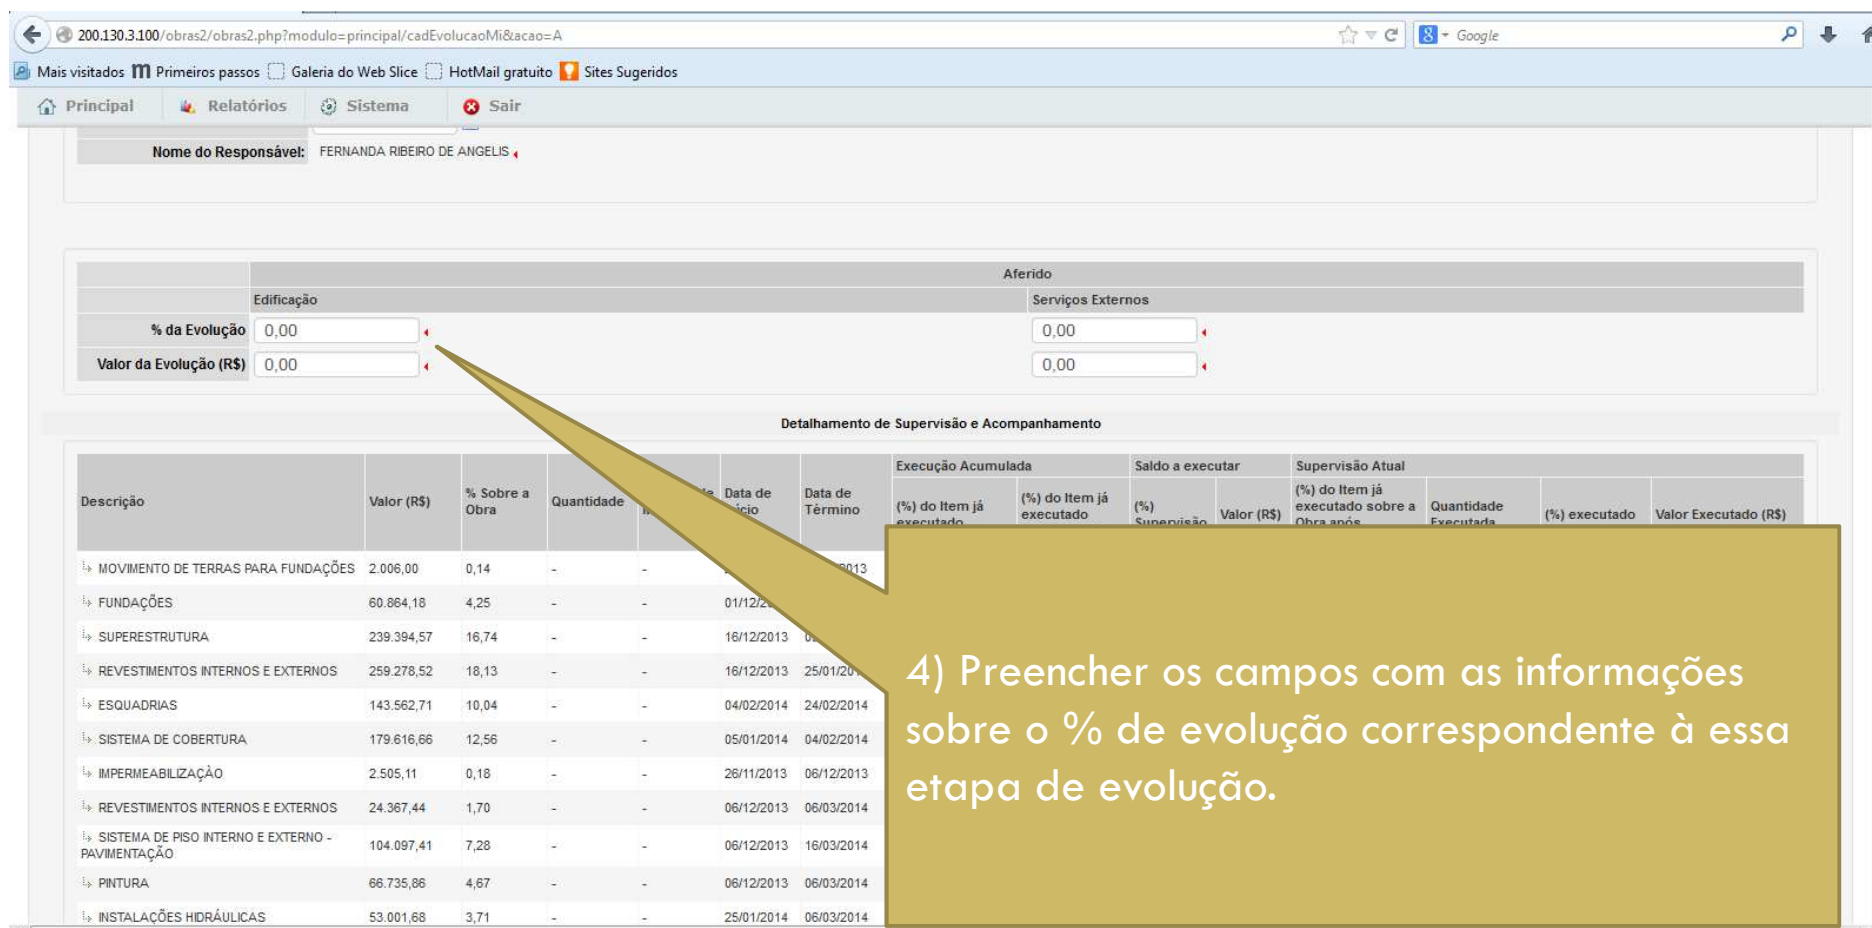

Nome do Responsável: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS

Edificação		Serviços Externos	
% da Evolução	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor da Evolução (R\$)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a executar		Supervisão Atual				
						(%) do Item já executado	(%) do Item já executado	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)	
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	01/12/2013									
FUNDAÇÕES	60.864,18	4,25	-	-	01/12/2013									
SUPERESTRUTURA	239.394,57	16,74	-	-	16/12/2013									
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	259.278,52	18,13	-	-	16/12/2013	25/01/2014								
ESQUADRIAS	143.562,71	10,04	-	-	04/02/2014	24/02/2014								
SISTEMA DE COBERTURA	179.616,66	12,56	-	-	05/01/2014	04/02/2014								
IMPERMEABILIZAÇÃO	2.505,11	0,18	-	-	26/11/2013	06/12/2013								
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,70	-	-	06/12/2013	06/03/2014								
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	104.097,41	7,28	-	-	06/12/2013	16/03/2014								
PINTURA	66.735,86	4,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.001,68	3,71	-	-	25/01/2014	06/03/2014								

4) Preencher os campos com as informações sobre o % de evolução correspondente à essa etapa de evolução.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Valor da Evolução (R\$) 240.388,35 18.469,77

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a executar		Supervisão Atual			
							(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)
↳ MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	26/11/2013	11/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.006,00	0,14	-	100,00	2006,00
↳ FUNDAÇÕES	60.864,18	4,18	-	-	01/12/2013	26/12/2013	0,00	0,00	100,00	60.864,18	4,18	-	100,00	60864,18
↳ SUPERESTRUTURA	239.394,57	16,45	-	-	16/12/2013	05/01/2014	0,00	0,00	100,00	239.394,57	3,29	-	20,00	47878,91
↳ SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	259.278,52	17,82	-	-	16/12/2013	25/01/2014	0,00	0,00	100,00	259.278,52	8,91	-	50,00	129639,26
↳ ESQUADRIAS	143.562,71	9,87	-	-	04/02/2014	24/02/2014	0,00	0,00	100,00	143.562,71	0,00	-	0,00	0,00
↳ SISTEMA DE COBERTURA	179.616,66	12,35	-	-	05/01/2014	04/02/2014	0,00	0,00	100,00	179.616,66	0,00	-	0,00	0,00
↳ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	100,00	24.367,44	0,00	-	0,00	0,00
↳ IMPERMEABILIZAÇÃO	2.505,11	0,17	-	-	26/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.505,11	0,00	-	0,00	0,00
↳ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	100,00	24.367,44	0,00	-	0,00	0,00
↳ SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO -	104.007,44	7,16	-	-	06/12/2013	16/03/2014	0,00	0,00	100,00	104.007,44	0,00	-	0,00	0,00

5) Preencher os campos de % executado com as informações sobre a evolução correspondente a essa etapa (percentual medido no período, não acumulativo). É possível também encontrar o percentual do item preenchendo a coluna de valor executado. O sistema calculará automaticamente o percentual correspondente.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Valor da etapa

Percentual executado da evolução

Preencher os campos de quantidade executada com as informações sobre a evolução correspondente a essa etapa (percentual medido no período, não acumulativo) também para os serviços externos

Salvar Voltar

Clicar em Salvar

Descrição	Valor Total (R\$)	Valor Unitário(R\$)	% sobre o total de serviços	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada	Saldo a executar	Supervisão Atual
								(%) do Item já executado	Valor (R\$)	(%) Supervisão
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	25.363,40	1,74				24/02/2014	16/03/2014	0,00	25.363,40	0,00
ATMO										
SE						16/03/2014	26/03/2014	0,00	38.468,96	0,00
SE						26/03/2014	05/04/2014	0,00	1.927,00	0,00
SE								100,00	20.669,00	100,00
TOTA								0,00	143.4050,7	16,52

Serviços Externos														
Descrição	Valor Total (R\$)	Valor Unitário(R\$)	% sobre o total de serviços	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a executar		Supervisão Atual		
								(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre o total de serviços	Quantidade já Executada	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) Supervisão	Quantidade já Executada
SONDAGEM DO								0,00	100,00	2.660,00	100,00	7,00	2660,00	42,60
												1,00	4784,77	76,60
									100,00	5.925,00	100,00	1,00	5925,00	94,90
								0,00	100,00	1.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	100,00	30.600,00	16,67	30,00	5100,00	8,17
								0,00	100,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	100,00	8.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										62447,08			18469,77	222,27

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Edição da Evolução MI

Dados do Acompanhamento

Data do Acompanhamento: 24/03/2014

Data Prevista de Conclusão: 12/03/2014

Nome do Responsável: FERNAND

estado atual

- Em Cadastro
- ações
- Enviar para validação
- histórico

Após Salvar a evolução, clicar em enviar para validação no workflow para que o fiscal da prefeitura valide o percentual informado.

Edificação

% da Evolução: 16,52

Valor da Evolução (R\$): 240.388,35

Serviços Externos

222,27

18.469,77

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a executar		Supervisão Atual			
							(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	26/11/2013	11/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.006,00	0,14	-	100,00	2.006,00

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Situação atual: Execução | Última atualização: | Supervisão FNDE | Extrato da Obra | Pendências | Acessar Obras 1 | Editar Licitação | Editar Contrato | Inserir aditivo | Histórico do contrato | Evolução MI

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (19651) EMEI Morada do Vale II
Pré-obra: (3913) EMEI Morada do Vale II
Município - UF: Gravataí - RS
Obra: (19651) EMEI Morada do Vale II
Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Edição da Evolução MI

Dados do Acompanhamento

Data do Acompanhamento: 24/03/2014
Data Prevista de Conclusão: 17/06/2014

estado atual
Validação
ações
Validar
Enviar para Correção
histórico

Após enviar para validação, a maneira de editar a evolução cadastrada é clicar em enviar para correção, no workflow.

Validação da Evolução – Fiscal da Obra

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&acao=A

Mais visitados Primeiros passos Galeria do Web Slice HotMail gratuito Sites Sugeridos

SIMEC Obras 2.0

Duvidas? Consulte as informações de ajuda para esta tela.

Principal / Metodologias Inovadoras / Lista de Obras

Lista de Obras MI

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: 19651 [Busca avançada]

Pesquisar Gerar Excel

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Empresa	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
							19651	3913			(19651) EMEI Morada do Vale II	(81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	PREF MUN DE GRAVATAI	Gravataí - RS			Execução	25/07/2013 (241 dia(s))				MI - Escola de Educação Infantil Tipo B	0,00


Total de Registros: 1

Após cadastramento da evolução da obra pela Empresa MI, o fiscal da obra deve validar o percentual informado. Para isso, o fiscal deve encontrar a obra e clicar no ícone

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

The screenshot shows the SIMEC web application interface. The top navigation bar includes the SIMEC logo, a dropdown menu set to 'Obras 2.0', and the user information: 'Usuário: LETICIA PEDROLI RENZ' with a session expiration of '59min37s'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Dados da Obra', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', 'Restrições e Inconformidades', 'Execução Orçamentária', and 'Extrato da Obra'. The main content area displays project details for 'Educação Básica' (Basic Education) at 'EMEI Morada do Vale II' in Gravataí - RS. A red circular stamp with 'MI' is visible on the right side of the details. Below the details is a table titled 'Lista de Evolução MI' (MI Evolution List) with the following data:

Ação	Data da Evolução	Data de Inclusão	Responsável	% Medido (Edificação)	% Validado (Edificação)	Valor (R\$) (Edificação)	% Medido (Serviços Externos)	% Validado (Serviços Externos)	Valor (R\$) (Serviços Externos)	Situação	Última tramitação
	24/03/2014	24/03/2014	FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS	16,52	0,00	240.388,35	222,27	0,00	18.469,77	Validação	FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS (24/03/2014 - 0 dia)

Below the table, there are two buttons: 'Cadastrar Nova Evolução' and 'Voltar para a Obra'. A yellow callout box points to the green checkmark icon in the 'Ação' column of the table row.

Para validar a evolução, o fiscal deve clicar no ícone



Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

The screenshot displays the 'Dados do Acompanhamento' (Monitoring Data) section of the Simec software. It includes input fields for 'Data do Acompanhamento' (24/03/2014), 'Data Prevista de Conclusão' (17/06/2014), and 'Nome do Responsável' (FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS). A table below compares 'Aferido' (Recorded) and 'Validado' (Validated) data for 'Edificação' and 'Serviços Externos'. The 'Validado' fields are currently empty, indicating they need to be filled. Below this is the 'Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento' (Supervision and Monitoring Detail) table, which shows a single entry for 'MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES' with a 0,14% deviation and 100% supervision completion.

Aferido				Validado			
	Edificação	Serviços Externos		Edificação	Serviços Externos		
% da Evolução	16,52	222,27		0,00	0,00		
Valor da Evolução (R\$)	240.388,35	18.469,77		0,00	0,00		

Descrição	Valor R\$	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a Executar		Supervisão Atual		Validação da Supervisão		
							(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	(%) do Item já executado sobre a Obra	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	26/11/2013	11/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.006,00	0,14			100,00	2.006,00

O fiscal da obra deve conferir os percentuais, alterar o que não concordar, preencher os campos de percentual e valores para a edificação e os serviços externos validados.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Descrição	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	% Sobre o total de serviços	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada			Saldo a executar		Supervisão Atual			Validação da Supervisão		
								(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	Quantidade já Executada	(%) Supervisão	Valor (R\$)	Quantidade já Executada	Valor Executado	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade já Executada	Valor Executado	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão
↳ SONDAGEM DO TERRENO	2.660,00	380,00	4,26	7,00	furo	07/11/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	2.660,00	7,00	2.660,00	4,26	<input type="text" value="7,00"/>	2.660,00	4,26
↳ PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	4.784,77	4.784,77	7,66	1,00	Unidade	07/11/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	4.784,77	1,00	4.784,77	7,66	<input type="text" value="1,00"/>	4.784,77	7,66
↳ FOSSA	5.925,00	5.925,00	9,49	1,00	Unidade	21/11/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	5.925,00	1,00	5.925,00	9,49	<input type="text" value="1,00"/>	5.925,00	9,49
↳ ACS - ACESSOS	1.449,63	53,10	2,32	27,30	m2	20/01/2014	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	1.449,63	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
↳ MURO	30.600,00	170,00	49,00	180,00	m	07/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	30.600,00	30,00	5.100,00	8,17	<input type="text" value="30,00"/>	5.100,00	8,17
↳ PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	8.420,00	10,00	13,48	842,00	m2	20/01/2014	19/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
↳ FECHAMENTOS	8.607,68	116,32	13,78	74,00	m2	20/01/2014	19/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	8.607,68	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
↳ MOMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,33	0,00	0,00	ton x km	07/11/2013	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0,00
TOTAL:	62447,08		99,99						0,00			62447,08		18469,77	29,58		18469,77	29,58

○ fiscal da obra deve clicar em salvar para finalizar a validação.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

Dados do Acompanhamento

Data do Acompanhamento: 24/03/2014
Data Prevista de Conclusão: 17/06/2014
Nome do Responsável: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS
Nome do Validador: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS

	Aferido		Validado	
	Edificação	Serviços Externos	Edificação	Serviços Externos
% da Evolução	16,52	222,27	0,00	0,00
Valor da Evolução (R\$)	240.388,35	18.469,77	0,00	0,00

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor R\$	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a Executar		Supervisão Atual		Quantidade Executada	Valor Executado
							(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão			
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	26/11/2013	11/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.006,00	0,14	100,00	2.006,00	

O fiscal da obra deve clicar em salvar para finalizar a validação. Após Salvar é necessário validar a medição no workflow.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

The screenshot displays the Simec Obras 2.0 web application. The browser address bar shows the URL: 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaEvolucaoMI&acao=A. The page title is 'Obras 2.0'. The user is identified as 'FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS' with a session expiration of 56 minutes. The navigation menu includes 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Dados do Empreendimento > Lista de obras do empreendimento > Dados da Obra > Licitação > Contratação > Cronograma > Vistorias > Recursos > Documentos > Galeria de Fotos > Restrições e Inconformidades > Registro de Atividades > Execução Orçamentária > Validação > Extrato da Obra'. The 'Situação atual' is 'Execução'. The 'Última atualização' is 'Supervisão FNDE'. The 'Tipo de ensino' is 'Educação Básica'. The 'Empreendimento' is '(19651) EMEI Morada do Vale II'. The 'Pré-obra' is '(3913) EMEI Morada do Vale II'. The 'Município - UF' is 'Gravatá - RS'. The 'Obra' is '(19651) EMEI Morada do Vale II'. A red circular stamp with 'MI' is visible on the right. Below the details is the 'Lista de Evolução MI' table.

Ação	Data da Evolução	Data de Inclusão	Responsável	% Medido (Edificação)	% Validado (Edificação)	Valor (R\$) (Edificação)	% Medido (Serviços Externos)	% Validado (Serviços Externos)	Valor (R\$) (Serviços Externos)	Situação	Última tramitação
	24/03/2014	24/03/2014	FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS	16,52	0,00	240.388,35	222,27	0,00	18.469,77	Concluído	ADONIAS ROSADA MALOSSO (24/03/2014 - 0 dia)

Buttons: [Cadastrar Nova Evolução](#) [Voltar para a Obra](#)

Após Validação, a situação da evolução muda para concluída.

Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI

Evolução da Obra – empresa MI

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadEvolucaoMi&acao=A

Mais visitados [Primeiros passos](#) [Galeria do Web Slice](#) [HotMail gratuito](#) [Sites Sugeridos](#)

Principal [Relatórios](#) [Sistema](#) [Sair](#)

Aferido

	Edificação	Serviços Externos
% da Evolução	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor da Evolução (R\$)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Execução Acumulada		Saldo a executar		Supervisão Atual			
							(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)
↳ MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	-	-	26/11/2013	11/12/2013	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ FUNDAÇÕES	60.884,18	4,18	-	-	01/12/2013	26/12/2013	100,00	4,18	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ SUPERESTRUTURA	239.394,57	16,45	-	-	16/12/2013	05/01/2014	20,00	3,29	80,00	191.515,66	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	259.278,52	17,82	-	-	16/12/2013	25/01/2014	50,00	8,91	50,00	129.639,26	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ ESQUADRIAS	143.562,71	9,87	-	-	04/02/2014	24/02/2014	0,00	0,00	100,00	143.562,71	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ SISTEMA DE COBERTURA	179.616,66	12,35	-	-	05/01/2014	04/02/2014	0,00	0,00	0,00	179.616,66	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	0,00	24.367,44	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ IMPERMEABILIZAÇÃO	2.505,11	0,17	-	-	26/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	104.097,41	7,16	-	-	06/12/2013	16/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ PINTURA	66.735,86	4,59	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
↳ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.001,68	3,64	-	-	25/01/2014	06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Quando o representante da empresa for cadastrar uma nova evolução, aparecerão os quantitativos medidos nas evoluções anterior validadas pelo fiscal.
